

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政
管网—规划三路（规划一路—姚港路）工程

项目编号：2102-320600-89-01-461493

建设地点：南通市崇川区

验收单位：南通城市建设集团有限公司



2025 年 6 月 6 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政管网—规划三路（规划一路—姚港路）工程	行业类别	其他城建工程
主管部门 （或主要投资方）	南通城市建设集团有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	南通市水利局 通水许可〔2024〕60号文，2024年12月4日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批准机关、文号及时间	南通市市政和园林局 通政园设〔2021〕157号文，2021年11月29日		
项目建设起止时间	2024年10月~2025年2月		
水土保持方案编制单位	江苏南京地质工程勘察院		
水土保持初步设计单位	南通市市政工程设计院有限责任公司		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	南通城欣市政工程有限公司		
水土保持监理单位	南通中房工程建设监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	南通成功勘测规划设计有限公司		

二、验收意见

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持设施验收管理办法>的通知》（苏水规〔2021〕8号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），2025年6月6日，南通城市建设集团有限公司在南通市崇川区主持召开了“滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政管网一规划三路（规划一路一姚港路）工程”水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位江苏南京地质工程勘察院，验收报告编制单位南通成功勘测规划设计有限公司，以及设计、监理、施工等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况和验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报，以及方案编制、施工和监理单位的补充说明，经质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政管网一规划三路（规划一路一姚港路）工程位于南通市崇川区狼山镇街道，属于新建建设类项目。项目东起规划一路（桩号为K0+027，经纬度为东经120°50'54"、北纬31°59'20"），西至姚港路（桩号K0+332，经纬度为东经120°50'48"、北纬31°59'12"），全长约0.305km，道路红线宽度15m，规划等级为城市支路，道路设计速度为30km/h。本工程建设内容包括道路工程、给排水工程、照明及亮

化工程、交通设施工程、辅助设施等，无绿化工程、桥隧工程和互通立交工程，绿化由市属国有企业绿化造园总公司负责项目立项、建设和管养，不在本工程建设范围内。本工程总占地 0.71hm^2 ，其中永久占地 0.48hm^2 ，临时占地 0.23hm^2 。工程于 2024 年 10 月开工建设，2025 年 2 月完工，总工期 5 个月；工程总投资 1900 万元，其中土建工程约 1244 万元。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2024 年 12 月 4 日，南通市水利局下发了通水许可〔2024〕60 号文件《南通市水利局关于准予滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政管网一规划三路（规划一路一姚港路）工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定》，对工程水土保持方案进行了批复。本项目无重大水土保持变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2021 年 8 月，南通市市政工程设计院有限责任公司完成了工程初步设计和施工图设计。2021 年 11 月，南通市市政和园林局下发了《关于滨江国际街区道路桥梁及市政管网工程一规划三路（规划一路~姚港路）工程初步设计的批复》（通政园设〔2021〕157 号）。

（四）项目区防治措施

在工程建设过程中，建设单位落实水土保持方案确定的各项防治措施，实施了雨水管网、透水铺装、土地整治、表土剥离、洗车设施、临时排水沟、沉沙池、撒播草籽、临时苫盖等措施。

1) 工程措施

路基工程区：表土剥离 0.07万 m^3 ，雨水管网 726m，透水铺

装 1620m²，土地整治 250m²；

施工生产区：土地整治 0.23hm²。

2) 植物措施

施工生产区：撒播草籽 0.23hm²。

3) 临时措施

路基工程区：洗车平台 1 套，临时排水沟 600m，沉沙池 2 座，临时苫盖 0.48hm²；

施工生产区：临时苫盖 0.23hm²。

(五) 验收工作情况和主要结论

2025 年 6 月，南通城市建设集团有限公司开展了本项目水土保持设施验收工作，并委托南通成功勘测规划设计有限公司对滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政管网一规划三路（规划一路一姚港路）工程进行水土保持设施验收工作。验收报告单位成立了验收报告编制组，确定了项目负责人及项目组成员，建立了日常联系工作制度，确定了评价进场时间和评价方案，开展了现场评价工作。

根据项目实际实施措施投资情况以及对主体工程和水土保持方案设计资料的分析，本项目实际完成水土保持总投资为 107.68 万元，其中工程措施费 79.44 万元，植物措施费 0.52 万元，临时措施费 14.99 万元，独立费用 8.90 万元，水土保持补偿费 0.7115 万元。通过对项目区水土流失防治效果验收与评价，水土保持措施实施后各项指标为：水土流失治理度 98.87%，土壤流失控制比 1.67，渣土防护率 99.42%；表土保护率 94.29%；根据《南通市财政局关于确认滨江国际街区道路桥梁及市政管网第八次工程概算

的请示》（通财政〔2023〕3号）、《南通市财政局关于确认滨江国际街区道路桥梁及市政管网第十次工程概算的请示》（通财政〔2024〕20号），本工程绿化由市属国有企业绿化造园总公司负责项目立项、建设和管养，不在本工程建设范围，故不考虑林草植被恢复率和林草覆盖率。其他防治指标均达到目标值。

验收主要结论：建设单位依法编报水土保持方案，缴纳水土保持补偿费，水土保持程序完整；水土流失防治任务完成；水土流失防治目标基本实现；落实水土保持措施，水土保持措施质量合格，水土保持设施运行正常；水土保持设施后续管理维护责任落实；工程水土保持设施达到验收合格标准，具备验收条件。

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的防治标准，符合水土保持设施验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（六）后续管护要求

验收组建议，应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

项目验收结束后，将水土保持设施一并移交工程运行管理单位，落实水土保持责任。

组长：苗根

2025年 6 月 6 日

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	黄根	南通城市建设集团有限公司	业主代表	黄根	建设单位
组员	王涛	南通市水利勘测设计研究院有限公司	高工	王涛	特邀专家
	黄根	南通城市建设集团有限公司	业主代表	黄根	建设单位
	施晓燕	南通市市政工程设计院有限责任公司	专业负责人	施晓燕	设计单位
	叶恒	南通城欣市政工程有限公司	项目经理	叶恒	施工单位
	魏为凯	南通中房工程建设监理有限公司	总监	魏为凯	监理单位
	王卫红	江苏南京地质工程勘察院	工程师	王卫红	水土保持方案编制单位
	朱雪雪	南通成功勘测规划设计有限公司	验收	朱雪雪	验收鉴定书编制单位

水土保持验收情况对照表

防治分区	措施类型	防治措施	单位	方案设计	实际完成	完成情况（%）	变化原因
路基工程区	工程措施	表土剥离	万 m³	0.07	0.07	100	无
		de300 雨水管网	m	90	90	100	无
		De400 雨水管网	m	60	60	100	无
		DN800 雨水管网	m	240	240	100	无
		DN1350 雨水管网	m	154	154	100	无
		DN1600 雨水管网	m	164	164	100	无
		DN2000 雨水管网	m	18	18	100	无
		透水铺装	m²	1620	1620	100	无
		土地整治	m²	250	250	100	无
	临时措施	洗车平台	套	1	1	100	无
		临时排水沟	m	600	600	100	无
		沉沙池	座	2	2	100	无
		临时苫盖	hm²	0.48	0.48	100	无
施工生产区	工程措施	土地整治	hm²	0.23	0.23	100	无
	植物措施	撒播草籽	hm²	0.23	0.23	100	无
	临时措施	临时苫盖	hm²	0.23	0.23	100	无

水土流失防治目标达标情况表

项目指标	目标值	计算依据	单位	数量	计算值	达标情况
水土流失治理度	98%	水土流失治理达标面积	hm²	0.702	98.87%	达标
		水土流失总面积	hm²	0.71		
土壤流失控制比	1.0	容许土壤流失量	t/（km²·a）	500	1.67	达标
		治理后每平方公里年平均土壤流失量	t/（km²·a）	300		
渣土防护率	99%	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量	万 m³	1.71	99.42%	达标
		永久弃渣和临时堆土总量	万 m³	1.72		
表土保护率	92%	保护的表土数量	m³	660	94.29%	达标
		可剥离表土总量	m³	700		
林草植被恢复率	/	林草类植被面积	hm²	/	/	/
		可恢复林草植被面积	hm²	/		
林草覆盖率	/	林草类植被面积	hm²	/	/	/
		防治责任范围总面积	hm²	/		

现场竣工照片



雨水管网



透水铺装



播撒草籽

南通市水利局文件

通水许可〔2024〕60号

南通市水利局关于准予滨江国际街区 （滨江片区）道路桥梁及市政管网—规划三路 （规划一路—姚港路）工程水土保持方案 告知承诺制的行政许可决定

南通城市建设集团有限公司：

你单位以告知承诺制方式申请的滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政管网—规划三路（规划一路—姚港路）工程水土保持方案行政许可，本局已依法受理（《南通市水利局受理通知书》编号：202412030016），经审查，符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定，决定准予行政许可。

一、该项目以“告知承诺制”方式进行审批，我局不对项目水土保持方案报告表具体内容进行实质审查。你单位是项目水土流失防治责任主体，按照《水土保持行政许可承诺书》及水土保

持方案报告表内容开展水土保持相关工作。如在水土保持工作中未按照规定要求以及承诺书内容履行相关责任和义务，由此导致的所有法律责任由你单位自行承担。

二、项目如发生地点、规模、水土保持措施及弃渣存放地等重大变更，须报本局重新审批，其他涉及水土保持方案的变更须报本局备案。我局将按照《省政府办公厅关于全面推行证明事项告知承诺制实施方案的通知》（苏政办发〔2020〕84号）要求加强项目事中事后监管，对你单位履行承诺情况进行监督检查。对不实承诺或者未履行承诺的，按规定开展责任追究和信用惩戒。崇川区农业农村和水利局应加强对辖区内水土保持方案实施情况的跟踪检查。

三、项目完工后你单位应当按照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》开展水土保持设施自主验收，验收结束后将验收材料向我局报备。未经验收或验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

四、项目建设如涉及其他行政许可事项的，应当依法办理相应审批手续。

五、根据《财政部关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》等相关规定，需在项目开工前向税务机关一次性缴纳水土保持补偿费共计 7115 元。



抄送：崇川区农业农村和水利局、市水政水资源监管保障中心。

南通市水利局办公室

2024年12月4日印发

水土保持方案报告表专家函审意见

项目名称	滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政管网—规划三路（规划一路—姚港路）工程		
函审专家	姓名	职称	工作单位
	陈海峰	高工	江苏省水文水资源勘测局南通分局

审查意见：

一、方案报告表项目选址符合规定要求，防治责任范围明确，防治标准符合规定要求，水土保持评价较全面，水土流失预测结论、水土保持措施布设基本合理，报告表总体达到水土保持技术标准规定要求。

二、主要修改意见

- 1.完善前期工作进展情况和水土保持措施实施情况；
- 2.完善平面布置和竖向设计；
- 3.复核工程占地和土石方平衡情况；
- 4.复核预测时段和土壤流失量；
- 5.复核水土保持措施布设情况表；
- 6.复核水土保持投资估算；
- 7.完善附件和附图。

已按审查意见修改，

陈海峰

2024.11.4

专家签字：陈海峰

2024 年 10 月 29 日

中央非税收入统一票据（电子）



票据代码：00010224
交款人统一社会信用代码：913206000586539525
交款人：南通城市建设集团有限公司

票据号码：3206011571
校验码：bfd58c
开票日期：2024年12月10日

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
30176	水土保持补偿费收入		1.0	7,115.00	7,115.00	电子税票号码： 332068241200011009
金额合计（大写） 人民币柒仟壹佰壹拾伍元整				（小写）¥ 7,115.00		
项目名称:水土保持补偿费收入-建设期收入 建设期项目-地市级审批 7115.0 合同编号： 其 他 信 息						

收款单位（章）：国家税务总局南通市税务局第三税务分局

复核人：

收款人：电子税务局



路基工程区

工程措施：施工前期对项目区域表土进行剥离，施工过程中于人行道双侧布设雨水管网、人行道路面铺设透水铺装，施工后期对人行道树池进行土地整治。

临时措施：施工期间在本工程起点处布设洗车设施、沿道路两侧布设临时排水沟、在临时排水沟出水口布设沉沙池、并对裸露地表进行临时苫盖。

施工生产区

工程措施：施工结束后对施工生产区进行土地整治。

植物措施：施工结束后对施工生产区进行撒播草籽。

临时措施：在施工过程中对裸露地表进行临时苫盖。

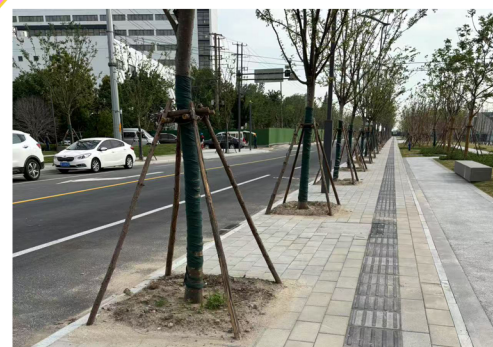


图 例

- 路基工程区
- 施工生产区
- 透水铺装
- 洗车设施
- 临时排水沟
- 沉沙池
- 水流方向

南通成功勘测规划设计有限公司

批 准	李 凌		滨江国际街区（滨江片区）道路桥梁及市政管网—规划三路（规划一路—姚港路）工程	
核 定	金琳琳	金琳琳		
审 查	赵 俊	赵俊	水土保持措施布设竣工验收图	
校 核	黄 峰	黄峰		
设 计	朱雯雯	朱雯雯	日 期	2025.6
制 图	卢祎苗	卢祎苗	图 号	附图1
